

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO PUC 2 - LA CITTA' DEL LAGO SISTEMAZIONE VIA B. BUOZZI E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Stefano Torrini, ingegnere

PROGETTISTI:

PROGETTISTA RESPONSABILE: Maurizio Serafini, ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E RESTAURO: Monica Gatti, architetto
Giovanni Carecci, architetto
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Davide Faralli, architetto
Maria Cristina Curti, architetto

RESPONSABILE SICUREZZA: Stefano Magionesi, geometra
COMPUTAZIONI: Simone Pagliacci, geometra



Via dei Fabbri, n. 1 - 06060 - Paciano (PG)
tel/fax 075 / 830563 - 8309014
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

COMUNE DI CASTIGLIONE
DEL LAGO

CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

X0-RCR01


Cronoprogramma

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
1	0	1	1	E	X0	R	RC	01	00	1011_E_X0_RCR01_00.xls	-
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Marzo 2010			M. Gatti			M. Serafini		M. Serafini		Consegna progetto esecutivo
1											
2											
3											

Cronoprogramma dei lavori

inizio	durata	fine	importi parz.	n.	Fasi di costruzione/giorni
0	5	5	0,00	1	Fase 0: Istallazione del cantiere
5	10	15	16.986,35	2	Fase 1: Demolizioni e rimozione della segnaletica
15	25	40	45.998,60	3	Fase 2: Rifacimento dei sottoservizi
40	40	80	87.175,51	4	Fase 3: Realizzazione dei marciapiedi e delle aiuole
80	25	105	49.709,70	5	Fase 4: Rifacimento dello strato di asfalto e della segnaletica orizzontale
105	5	110	5.146,41	6	Fase 5: Semina e piantumazione arbusti
110	10	120	23.701,23	7	Fase 6: Installazione pali illuminazione e segnaletica verticale

228.717,80

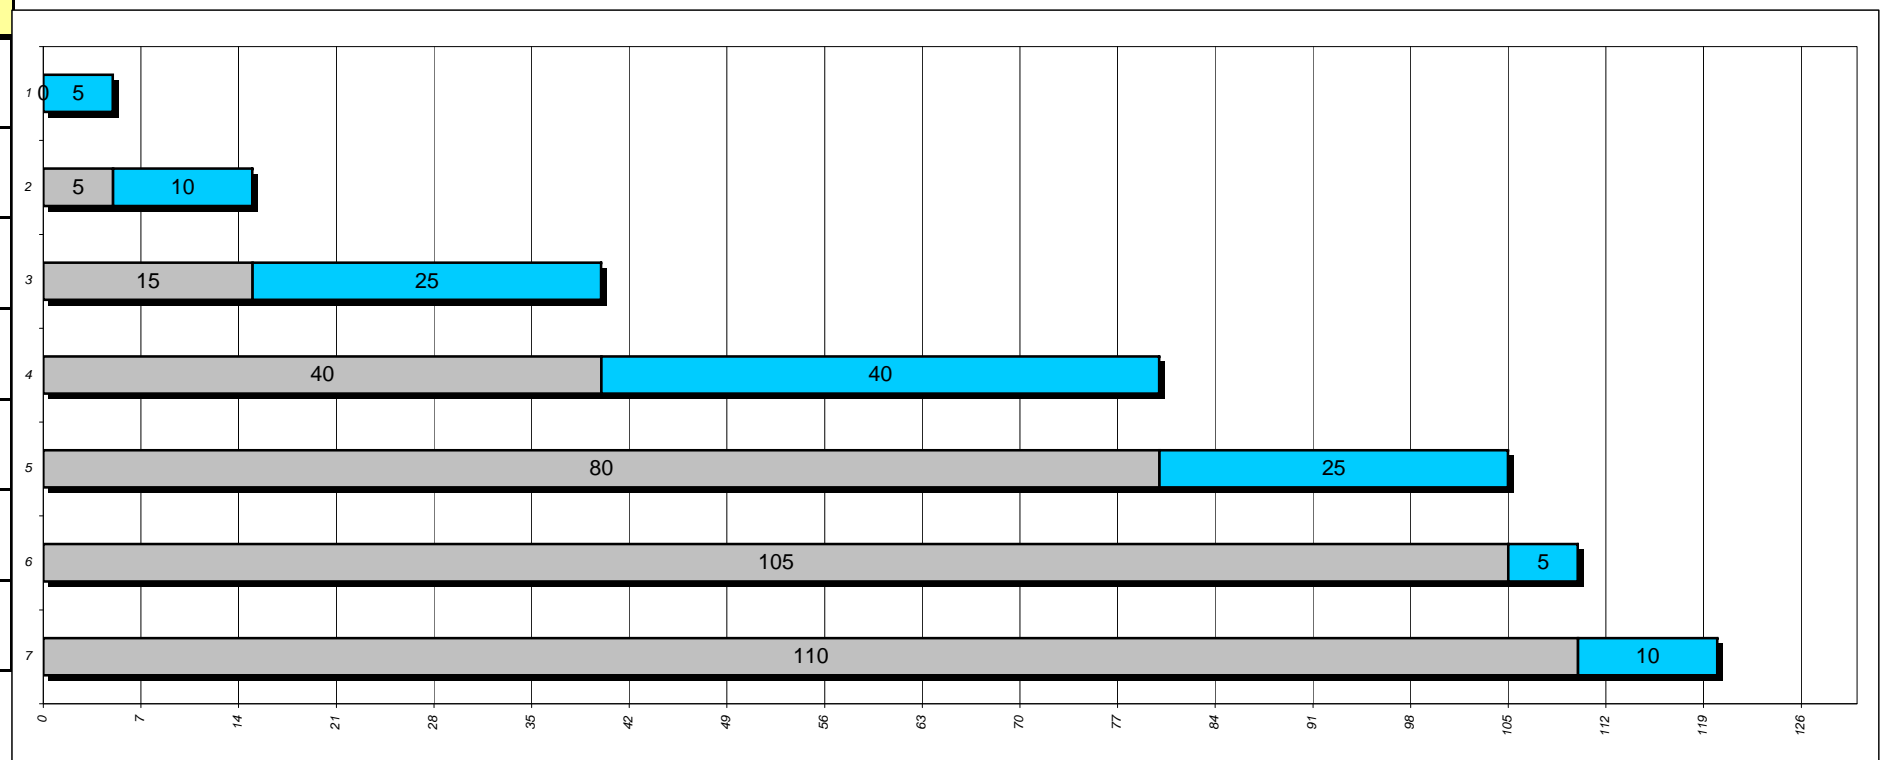

IMPORTI PROGRESSIVI

